

Acompanhar projetos **feitos com agentes**

O que muda no trabalho da equipe, o que passa a existir em cada projeto e onde a gestão entra.
Não é sobre aprender a ferramenta — é sobre saber o que pedir e o que conferir.

1 HORA → UM ENCONTRO → SAI O COMBINADO DA ÁREA

A equipe já usa agentes. O que falta não é ferramenta, é processo.

Tudo o que não é definido antes de pedir vira uma decisão que o agente toma sozinho.

NO DIA A DIA

O que muda para a equipe

- Define problema, escopo e critérios antes de pedir código
- Divide a demanda em partes pequenas, cada uma verificável
- Escreve as regras do projeto para o agente seguir
- Valida antes de dizer que terminou

NA GESTÃO

O que muda para você

- Aprova escopo e critérios antes, não a entrega pronta
- Acompanha por artefato escrito, não por status verbal
- Cobra evidência de validação junto com a entrega
- Decide o que é de negócio — o agente executa o resto

O trabalho da gestão não aumenta: ele muda de lugar — do fim para o começo de cada entrega.

Um aplicativo que funciona pode expor o dado de outra pessoa

Demonstração ao vivo, em quatro passos.

QUATRO PASSOS, 20 SEGUNDOS

1. entra como ana@empresa.com
2. cria a tarefa “consulta médica”
3. clica em sair
4. entra como joao@empresa.com

→ a tarefa da Ana está lá

O ponto para a gestão: isso passa por qualquer aceite baseado em ver funcionando.


A CAUSA

Ninguém programou esse vazamento

- Não é erro de programação: é consequência de desorganização
- Com sete chaves de armazenamento espalhadas por quatro arquivos, não havia onde escrever a regra “os dados são de quem entrou”
- No projeto organizado, a regra tem um endereço único — e um teste que a protege

Cinco etapas — e a pergunta que a gestão faz em cada uma

Uma etapa produz a entrada da próxima. O agente ajuda em todas, mas não decide sozinho.

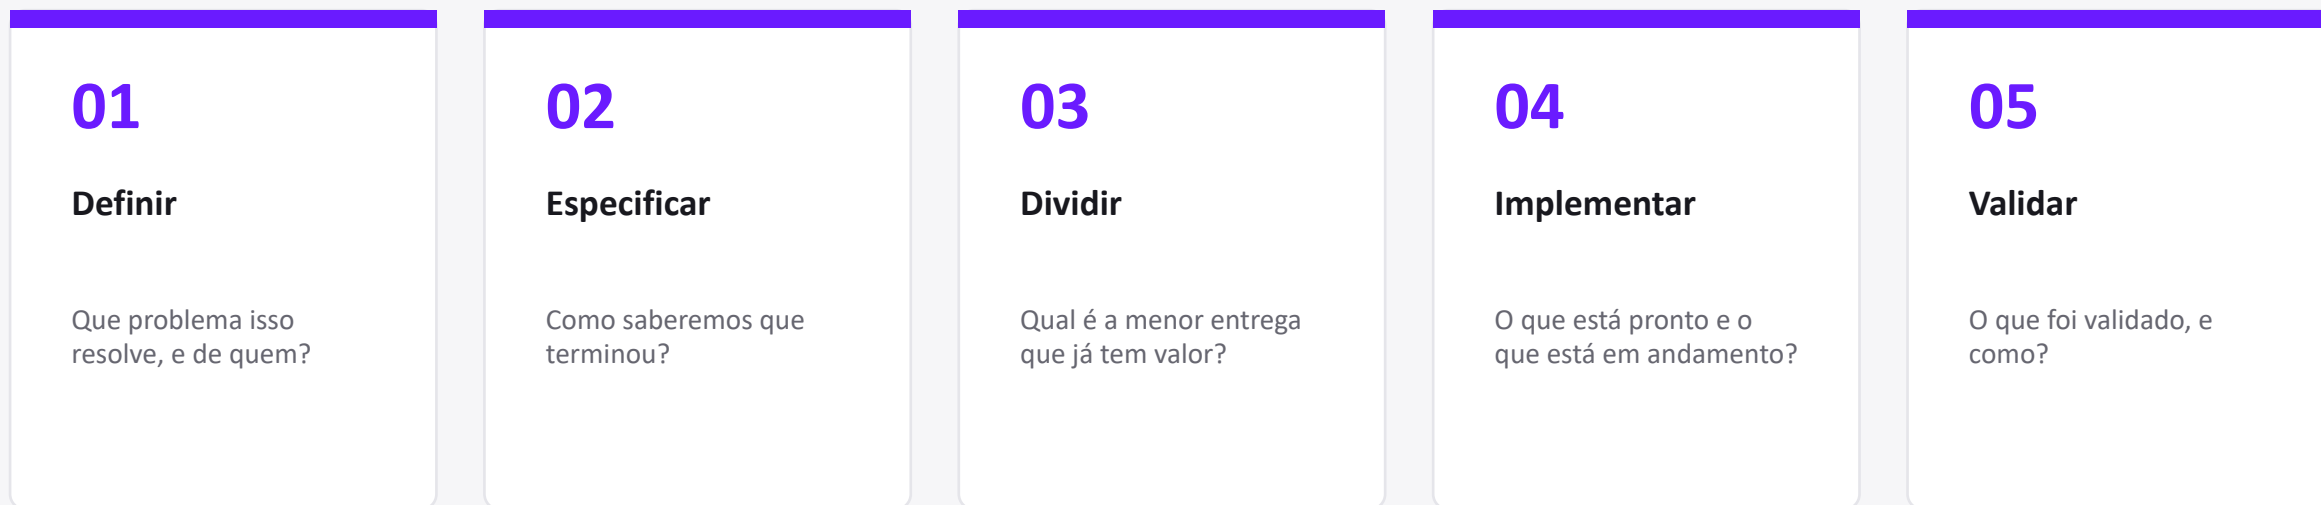

As perguntas acima são o roteiro de acompanhamento inteiro. Nenhuma delas exige conhecimento técnico.

O que passa a existir em cada projeto

Nenhum é documento novo: todos saem do próprio trabalho, com ajuda do agente.

Artefato	O que é	O que a gestão confere
Escopo e não escopo	O que entra agora e o que fica explicitamente de fora	a lista de não escopo existe e não está vazia
Critérios de aceite	Cada funcionalidade descrita de forma verificável, antes de implementar	dá para responder sim ou não, sem interpretação
Regras do projeto	As instruções que o agente é obrigado a seguir no repositório	existem, e alguém além do autor leu
Registro de entrega	O que mudou, por quê, e a prova de que foi validado	traz a evidência, não só a descrição

É por estes quatro que a área é acompanhada — não por reunião de status.

Cinco perguntas para quando alguém disser “está pronto”

Uma conversa de cinco minutos, sem nenhuma pergunta técnica.

- Quais critérios estavam escritos, e foram atendidos?
- O que foi validado, e como?
- O que ficou de fora?
- Se essa pessoa sair de férias, quem continua?
- Alguma decisão de negócio foi tomada no caminho?

ECONOMIA DE TEMPO

O que não vale a pena perguntar

- Qual linguagem ou biblioteca foi usada
- Quantas linhas de código tem
- Se o agente escreveu tudo sozinho
- Se está “100% pronto” — prefira “quais critérios faltam”

“Testei aqui e funcionou” descreve uma demonstração — não uma validação.

A gestão entra no começo e no fim de cada incremento

Se um projeto precisa de aprovação a cada passo, o escopo estava grande demais.

ACOMPANHAMENTO

Faça

- Aprovar escopo e critérios antes de a implementação começar
- Pedir a evidência junto com a entrega
- Ler o não escopo e questionar o que ficou de fora
- Perguntar quem mais consegue continuar aquele projeto

CUSTA TEMPO E NÃO REDUZ RISCO

Evite

- Revisar código
- Pedir relatório de status em reunião
- Reabrir escopo no meio sem registrar a decisão
- Aceitar “só o fulano sabe mexer nisso” como resposta

O prazo de resposta da gestão faz parte do processo: decisão que demora mais de um dia útil precisa de outro dono.

O que preenchemos juntos agora

É o entregável deste encontro — e a entrada da formação da equipe.

Bloco	O que sai preenchido
1 · O que vale para todo projeto	quais artefatos passam a ser obrigatórios, e a partir de quando
2 · Quem decide o quê	dono e prazo de resposta para escopo, critérios, integrações e aceite
3 · Como a evidência chega	onde ficam os artefatos e o que a gestão recebe quando algo fica pronto
4 · Limites da área	dado de pessoa real, credenciais, integrações que escrevem, publicação externa
5 · Quem participa do Momento 2	nomes, duplas e a demanda real que cada uma vai levar
6 · Como saberemos que valeu	até três sinais observáveis, e a data de revisão

Combinado incompleto e honesto vale mais que combinado inventado: onde houver dúvida, escrevemos a dúvida.

Momento 2 — a formação de quem vai implementar

Três encontros de duas horas, sobre uma demanda real da área.

Dia	O que a equipe faz	O que a área recebe
1	Define o projeto: problema, escopo, não escopo e critérios	a definição escrita, versionada
2	Escreve as regras do projeto e revisa um plano gerado pelo agente	as regras e o plano revisado
3	Constrói, testa, documenta e registra a entrega	a aplicação e o registro de entrega

A demanda que cada dupla leva não é exercício: sai da formação como entrega da área.

SAÍMOS DAQUI COM

O combinado da área **preenchido**

- Os artefatos que passam a ser obrigatórios em todo projeto
- Quem decide o quê — e em quanto tempo responde
- Onde a evidência fica e o que a gestão recebe a cada entrega
- Quem participa do Momento 2 e com qual demanda real
- Os sinais que a área vai observar, e quando revisamos

Revisão sugerida: 2 a 3 semanas depois do último encontro do Momento 2
